سوابق بازنگری مدرک

ویرایش	تاریخ	شرح تغییرات	تصویب‌کننده
۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	صدور اولیه	مدیرعامل

۱- مقدمه و مبانی برنامه

این برنامه، راهبردهای ST1، SO1 و WO2 سند مدیریت استراتژیک (SP-01) را برای دوره ۱۴۰۶ تا ۱۴۱۰ به پروژه‌ها و فعالیت‌های عملیاتی زمان‌بندی‌شده تبدیل می‌کند. شرکت کالا تجارت روزبه طی این دوره از یک «واردکننده» به یک «واردکننده، مونتاژکننده و صادرکننده» تبدیل می‌شود.


محور الف: احداث کارخانه مونتاژ	محور ب: توسعه صادرات	محور ج: واردات در قبال صادرات
• کارخانه مونتاژ خودروی سواری (SKD سپس CKD) با شریک خارجی • ظرفیت هدف: [۱۰,۰۰۰] دستگاه در سال (دو شیفت) • داخلی‌سازی تدریجی قطعات • تولید آزمایشی: نیمه اول ۱۴۰۹	• ایجاد واحد صادرات • صادرات کالاهای غیرخودرویی برای ارزآوری از سال اول • صادرات قطعات و خدمات فنی از ۱۴۰۸ • صادرات خودروی مونتاژی به کشورهای همسایه از ۱۴۱۰	• تأمین ارز واردات از محل صادرات (خود شرکت یا اشخاص ثالث) مطابق مقررات جاری • کاهش وابستگی به تخصیص ارز • واردات قطعات CKD و ماشین‌آلات در قبال صادرات • رفع تعهد ارزی کامل و به‌موقع

مفروضات کلیدی: (۱) تداوم امکان قانونی واردات خودرو و قطعات و سازوکار واردات در قبال صادرات؛ (۲) همکاری سازنده خارجی برای انتقال فناوری؛ (۳) تأمین مالی پروژه از آورده سهامداران و تسهیلات. هرگونه تغییر در این مفروضات طبق PR-12 ارزیابی و برنامه بازنگری می‌شود.

این مدرک متعلق به شرکت کالا تجارت روزبه است و هرگونه تکثیر بدون مجوز ممنوع است. نسخه چاپی فاقد مهر «کنترل‌شده» فاقد اعتبار است.

۲- نمودار زمان‌بندی (گانت) پنج‌ساله

برنامه عملیاتی پنج‌ساله (۱۴۰۶ تا ۱۴۱۰) – شرکت کالا تجارت روزبه

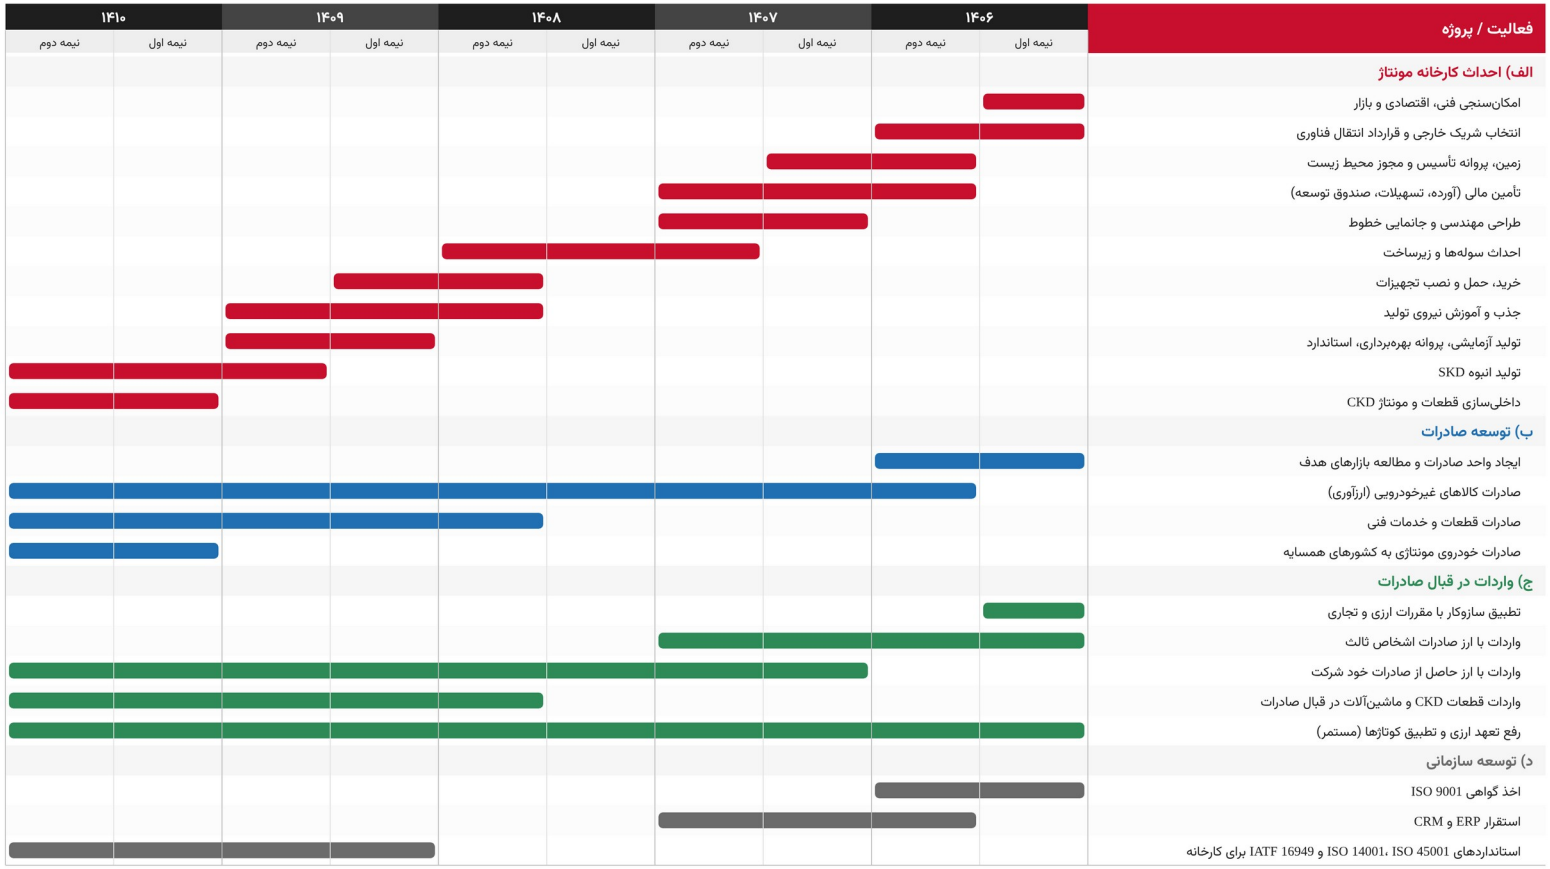

کد مدرک: OP-01 | ویرایش ۰۰ | جهت زمان: از راست به چپ

این مدرک متعلق به شرکت کالا تجارت روزبه است و هرگونه تکثیر بدون مجوز ممنوع است. نسخه چاپی فاقد مهر «کنترل‌شده» فاقد اعتبار است.

۳- محور الف: برنامه احداث کارخانه مونتاژ

۳-۱ مشخصات پیشنهادی طرح

مورد	شرح
محصول	خودروی سواری [برند/مدل‌ها] شامل نسخه‌های بنزینی، هیبریدی و برقی
روش تولید	مرحله ۱: SKD (مونتاژ نیمه‌قطعه)؛ مرحله ۲: CKD شامل بدنه‌سازی، رنگ و مونتاژ نهایی؛ مرحله ۳: داخلی‌سازی قطعات
ظرفیت	سال اول بهره‌برداری [۳,۰۰۰] دستگاه؛ ظرفیت اسمی [۱۰,۰۰۰] دستگاه در سال
محل	[شهرک صنعتی / منطقه ویژه اقتصادی ...] با دسترسی به گمرک، بندر یا مرز و شبکه حمل‌ونقل
زمین و ساختمان	زمین [۱۰] هکتار؛ سوله‌های مونتاژ، رنگ، انبار قطعات، پارکینگ محصول، آزمایشگاه کنترل کیفیت، پیست تست، ساختمان اداری
نیروی انسانی	حدود [۳۵۰] نفر در ظرفیت اسمی (تولید، کیفیت، مهندسی، پشتیبانی)
شریک فناوری	[نام سازنده] – قرارداد انتقال فناوری، تأمین کیت‌ها، آموزش و مجوز استفاده از نشان تجاری
استانداردها	استانداردهای اجباری خودرو، ISO 45001، ISO 14001، IATF 16949، ISO 9001

۳-۲ مراحل اجرایی، مجوزها و تحویل‌شدنی‌ها

مرحله	فعالیت‌ها	مجوزها / مراجع	تحویل‌شدنی	زمان	مسئول
۱	مطالعات امکان‌سنجی فنی، اقتصادی، مالی و بازار؛ تحلیل حساسیت ارزی	–	گزارش توجیهی طرح (Feasibility)	نیمه اول ۱۴۰۶	مدیرعامل / مشاور
۲	انتخاب شریک خارجی، مذاکره و انعقاد قرارداد انتقال فناوری و تأمین کیت	تأیید هیئت‌مدیره	قرارداد امضاشده	۱۴۰۶	مدیر بازرگانی خارجی
۳	انتخاب و تملک زمین؛ اخذ مجوزهای تأسیس	وزارت صمت (پروانه تأسیس/جواز)، سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت شهرک‌ها یا سازمان منطقه	پروانه تأسیس، قرارداد زمین	نیمه دوم ۱۴۰۶ – نیمه اول ۱۴۰۷	مدیر پروژه
۴	تأمین مالی: آورده سهامداران، تسهیلات بانکی، منابع صندوق توسعه ملی یا ثبت طرح در سامانه‌های حمایتی	بانک‌ها، صندوق توسعه ملی	قرارداد تسهیلات	۱۴۰۶ – ۱۴۰۷	مدیر مالی

این مدرک متعلق به شرکت کالا تجارت روزبه است و هرگونه تکثیر بدون مجوز ممنوع است. نسخه چاپی فاقد مهر «کنترل‌شده» فاقد اعتبار است.

مرحله	فعالیت‌ها	مجوزها / مراجع	تحویل‌شدنی	زمان	مسئول
۵	طراحی پایه و تفصیلی، جانمایی خطوط (Layout)، طراحی تأسیسات	نظام مهندسی	نقشه‌های اجرایی	۱۴۰۷	مشاور طراحی
۶	احداث سوله‌ها، فونداسیون، تأسیسات، برق، گاز، آب و تصفیه‌خانه	انشعابات، آتش‌نشانی	ساختمان تکمیل‌شده	نیمه دوم ۱۴۰۷ – نیمه دوم ۱۴۰۸	پیمانکار EPC
۷	خرید، حمل و نصب تجهیزات (جیگ‌ها، کانوایر، سالن رنگ، تجهیزات تست) در قبال صادرات یا از محل منابع ارزی	ثبت سفارش ماشین‌آلات	خطوط نصب‌شده	نیمه دوم ۱۴۰۸ – نیمه اول ۱۴۰۹	مدیر پروژه
۸	جذب و آموزش نیروی تولید (داخل کشور و نزد سازنده)	—	نیروی آموزش‌دیده	نیمه دوم ۱۴۰۸ – نیمه دوم ۱۴۰۹	منابع انسانی
۹	تولید آزمایشی، تأییدیه نوعی و استاندارد، پروانه بهره‌برداری، کد شماره‌گذاری	سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت، پلیس راهور	پروانه بهره‌برداری	۱۴۰۹	مدیر کارخانه
۱۰	تولید انبوه SKD؛ سپس CKD و داخلی‌سازی (هدف ≤ [۳۰٪] تا پایان ۱۴۱۰)	—	تیراژ هدف	نیمه دوم ۱۴۰۹ – ۱۴۱۰	مدیر کارخانه

۳-۳ برآورد سرمایه‌گذاری (جهت تکمیل پس از امکان‌سنجی)

ردیف	سرفصل	ریالی (میلیارد ریال)	ارزی (میلیون یورو/دلار)	منبع تأمین
۱	زمین و آماده‌سازی	[...]	—	آورده
۲	ساختمان و تأسیسات	[...]	—	آورده + تسهیلات
۳	ماشین‌آلات و تجهیزات	[...]	[...]	ارز صادراتی + تسهیلات ارزی
۴	انتقال فناوری و آموزش	—	[...]	ارز صادراتی
۵	سرمایه در گردش (کیت اولیه)	[...]	[...]	تسهیلات
۶	پیش‌بینی نشده (۱۰٪)	[...]	[...]	—
	جمع	[...]	[...]	

این مدرک متعلق به شرکت کالا تجارت روزبه است و هرگونه تکثیر بدون مجوز ممنوع است. نسخه چاپی فاقد مهر «کنترل‌شده» فاقد اعتبار است.

۴- محور ب: برنامه توسعه صادرات

بازار هدف	کالاهای صادراتی (مرحله ۱: ارزآوری)	کالاهای صادراتی (مرحله ۲ و ۳)	کانال ورود
عراق	[مصالح ساختمانی، مواد غذایی، محصولات پتروشیمی و فولادی]	قطعات یدکی، خدمات فنی، خودروی مونتاژی	نماینده محلی، نمایشگاه
افغانستان	[محصولات کشاورزی و غذایی، مواد شوینده]	قطعات و خودرو	شرکای تجاری مرزی
آسیای میانه و قفقاز	[محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی]	قطعات و خودرو	مناطق آزاد، کریدور شمال-جنوب
امارات و حاشیه خلیج فارس	[محصولات کشاورزی، مواد معدنی]	قطعات یدکی	دفتر نمایندگی

- **ساختار:** ایجاد واحد صادرات زیر نظر مدیر بازرگانی خارجی (۱۴۰۶)؛ عضویت فعال در اتاق بازرگانی و تشکل‌های صادراتی.
- **الزامات:** کارت بازرگانی معتبر، کد اقتصادی، ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت، استانداردها و گواهی‌های بهداشتی/کیفی کالاهای صادراتی، گواهی مبدأ، رعایت مقررات بازگشت ارز.
- **کنترل کیفیت صادرات:** کالاهای صادراتی فقط از تأمین‌کنندگان ارزیابی‌شده (PR-05) و با بازرسی پیش از بارگیری.

شاخص	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰
ارزش صادرات کالاهای غیرخودرویی (میلیون دلار)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
ارزش صادرات قطعات و خدمات (میلیون دلار)	—	—	[...]	[...]	[...]
تعداد خودروی مونتاژی صادرشده	—	—	—	—	[...]
تعداد بازارهای فعال صادراتی	۱	۲	۳	۳	۴

۵- محور ج: واردات در قبال صادرات

واردات در قبال صادرات سازوکاری است که در آن ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، طبق ضوابط بانک مرکزی و وزارت صمت، برای ثبت سفارش و واردات کالا (خودرو، قطعات CKD و ماشین‌آلات) به کار می‌رود. این روش وابستگی شرکت به تخصیص ارز را کم می‌کند و تعهد ارزی صادرات را نیز رفع می‌کند. **از آنجا که ضوابط این سازوکار مرتباً تغییر می‌کند، پیش از هر اقدام، آخرین مصوبات و بخشنامه‌ها توسط مدیر واردات و مشاور حقوقی بررسی و در فهرست مدارک برون‌سازمانی ثبت می‌شود.**

این مدرک متعلق به شرکت کالا تجارت روزبه است و هرگونه تکثیر بدون مجوز ممنوع است. نسخه چاپی فاقد مهر «کنترل‌شده» فاقد اعتبار است.

۵-۱ گردش کار

گام	شرح	مسئول	سابقه
۱	برنامه‌ریزی نیاز ارزی واردات هر فصل و تعیین سهم ارز صادراتی	مدیر مالی + مدیر واردات	برنامه ارزی فصلی
۲	انجام صادرات (توسط شرکت) یا تفاهم قانونی با صادرکننده ثالث برای واگذاری ارز حاصل از صادرات	واحد صادرات / مدیر بازرگانی	قرارداد، پروانه صادراتی
۳	ثبت و تأیید ارز حاصل از صادرات در سامانه‌های ذیربط و رفع تعهد ارزی صادرکننده	مدیر مالی	گواهی رفع تعهد
۴	ثبت سفارش واردات با منشأ ارزی «صادرات» و تطبیق مبالغ و کوتاژها	کارشناس ثبت سفارش	ثبت سفارش
۵	انتقال ارز به فروشنده خارجی از مجاری قانونی و ادامه فرایند واردات طبق PR-06	مدیر مالی + مدیر واردات	اسناد بانکی، F-14
۶	تطبیق نهایی ارز صادرات و واردات، بایگانی پرونده و گزارش فصلی به مدیرعامل	مدیر مالی	گزارش تطبیق

۵-۲ اهداف سالانه

شاخص	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰
سهم واردات تأمین‌شده از ارز صادرات (کل)	۲۰٪	۳۵٪	۵۰٪	۶۰٪	۷۰٪
سهم ارز حاصل از صادرات خود شرکت	۵٪	۲۵٪	۴۰٪	۵۰٪	۶۰٪
درصد تعهدات ارزی رفع‌شده در مهلت قانونی	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪

۵-۳ کنترل‌های انطباق

- همکاری فقط با صادرکنندگان دارای سابقه شفاف و از مسیرهای قانونی؛ عدم خرید و فروش غیرمجاز کارت بازرگانی یا کوتاژ.
- تطبیق ماهانه ارز صادراتی و وارداتی توسط واحد مالی.
- ممیزی داخلی سالانه این فرایند (PR-02) و گزارش در بازنگری مدیریت.

این مدرک متعلق به شرکت کالا تجارت روزبه است و هرگونه تکثیر بدون مجوز ممنوع است. نسخه چاپی فاقد مهر «کنترل‌شده» فاقد اعتبار است.

۶- برنامه سالانه و نقاط عطف (Milestones)

سال	کارخانه	صادرات	واردات در قبال صادرات	توسعه سازمانی
۱۴۰۶	امکان‌سنجی؛ قرارداد با شریک خارجی؛ آغاز اخذ مجوزها	ایجاد واحد صادرات؛ نخستین محموله صادراتی	تدوین سازوکار؛ واردات با ارز صادرات ثالث	اخذ گواهی ISO 9001
۱۴۰۷	پروانه تأسیس؛ زمین؛ تأمین مالی؛ طراحی؛ آغاز احداث	۲ بازار فعال	آغاز استفاده از ارز صادرات خود شرکت	استقرار ERP/CRM؛ ایجاد PMO
۱۴۰۸	تکمیل ساختمان؛ آغاز نصب تجهیزات؛ جذب نیرو	آغاز صادرات قطعات و خدمات	واردات ماشین‌آلات در قبال صادرات	طراحی ساختار کارخانه
۱۴۰۹	تولید آزمایشی؛ تأییدیه‌ها؛ پروانه بهره‌برداری؛ آغاز SKD	۳ بازار فعال	واردات کیت SKD/CKD در قبال صادرات	استقرار IATF 16949
۱۴۱۰	تولید انبوه؛ CKD؛ داخلی‌سازی ≥ [۳۰٪]	صادرات خودروی مونتاژی	سهم ۷۰٪ ارز صادراتی	ISO 14001 و ISO 45001

۷- ساختار راهبری و پایش برنامه

- **کمیته راهبری:** مدیرعامل (رئیس)، مدیران مالی، بازرگانی، واردات و مدیر پروژه؛ جلسه ماهانه.
- **دفتر مدیریت پروژه (PMO):** برنامه‌ریزی تفصیلی، کنترل پروژه (زمان، هزینه، کیفیت)، گزارش پیشرفت ماهانه با شاخص‌های SPI و CPI.
- **گزارش‌دهی:** گزارش ماهانه پیشرفت به کمیته راهبری و گزارش فصلی به هیئت‌مدیره.
- **بازنگری:** برنامه سالانه در جلسه بازنگری مدیریت و در صورت تغییر مفروضات کلیدی بازنگری می‌شود.

۸- ریسک‌های کلیدی برنامه

ریسک	احتمال	شدت	اقدام پاسخ
تغییر مقررات واردات یا سازوکار واردات در قبال صادرات	زیاد	زیاد	پایش مستمر مقررات؛ تنوع منابع ارزی؛ سناریوهای جایگزین در برنامه
عدم همکاری یا خروج شریک خارجی به دلیل تحریم	متوسط	بسیار زیاد	قرارداد با بندهای حمایتی؛ شناسایی شریک جایگزین؛ مستندسازی فناوری
افزایش هزینه احداث به دلیل تورم و نرخ ارز	زیاد	زیاد	قراردادهای EPC با سقف قیمت؛ خرید زودهنگام تجهیزات؛ ذخیره ۱۰٪
تأخیر در اخذ مجوزها	متوسط	زیاد	شروع زودهنگام؛ مشاور متخصص؛ پیگیری هفتگی
عدم تحقق ارزآوری صادراتی	متوسط	زیاد	تنوع کالا و بازار؛ قراردادهای بلندمدت با خریداران
کمبود نیروی متخصص تولید	متوسط	متوسط	آموزش زودهنگام نزد سازنده؛ همکاری با دانشگاه‌ها و هنرستان‌ها

این مدرک متعلق به شرکت کالا تجارت روزبه است و هرگونه تکثیر بدون مجوز ممنوع است. نسخه چاپی فاقد مهر «کنترل‌شده» فاقد اعتبار است.

تهیه‌کننده	تأییدکننده	تصویب‌کننده
نام: [.....] سمت: نماینده مدیریت	نام: [.....] سمت: مدیر واحد مربوط	نام: [.....] سمت: مدیرعامل
امضا: تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۸	امضا: تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۸	امضا: تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۸

این مدرک متعلق به شرکت کالا تجارت روزبه است و هرگونه تکثیر بدون مجوز ممنوع است. نسخه چاپی فاقد مهر «کنترل‌شده» فاقد اعتبار است.
